



*L' Ufficio Speciale per la ricostruzione di L'Aquila*

*Lo stato delle pratiche per la ricostruzione delle Frazioni*

*Marzo 2016*



*Diagramma di programmazione istruttorie CS USRA*

| <i>2013-2014 Pratiche Itruite</i>      |         |
|--|---------|
| <b>CS Capoluogo-<br/>Asse Centrale</b> | VP 465  |
|  | Sp1 142 |
| <b>CS Frazioni<br/>D4-D5</b>           | VP 89   |
|  | Sp1 27  |

| <i>2015 Pratiche Istruite</i>          |         |
|--|---------|
| <b>CS Capoluogo-<br/>Asse Centrale</b> | VP 135  |
|  | Sp1 77  |
|  | Sp2 87  |
| <b>CS Frazioni<br/>D4-D5</b>           | VP 96   |
|  | Sp1 157 |

| <i>2016 Da istruire</i>      |            |
|------------------------------|------------|
| <b>CS Capoluogo</b>          | Sp1 102    |
|                              | Sp2 22+182 |
| <b>CS Frazioni<br/>D4-D5</b> | VP 109     |
|                              | Sp1 349    |
|                              | Sp2 39+70  |

Fine istruttoria  
VP e Sp1 CS  
Frazioni D4-D5

| <i>2017 Da Istruire</i>      |         |
|------------------------------|---------|
| <b>CS Capoluogo</b>          | Sp1 42  |
|                              | Sp2 34  |
| <b>CS Frazioni<br/>D4-D5</b> |         |
|                              |         |
|                              | Sp2 273 |

Fine istruttoria  
Sp2 CS L'Aquila


Inizio istruttoria  
VP e Sp1  
Frazioni D3-D2

Fine istruttoria  
Sp2 CS Frazioni  
D4-D5



*Programmazione USRA*

*Istruttorie CS Frazioni*

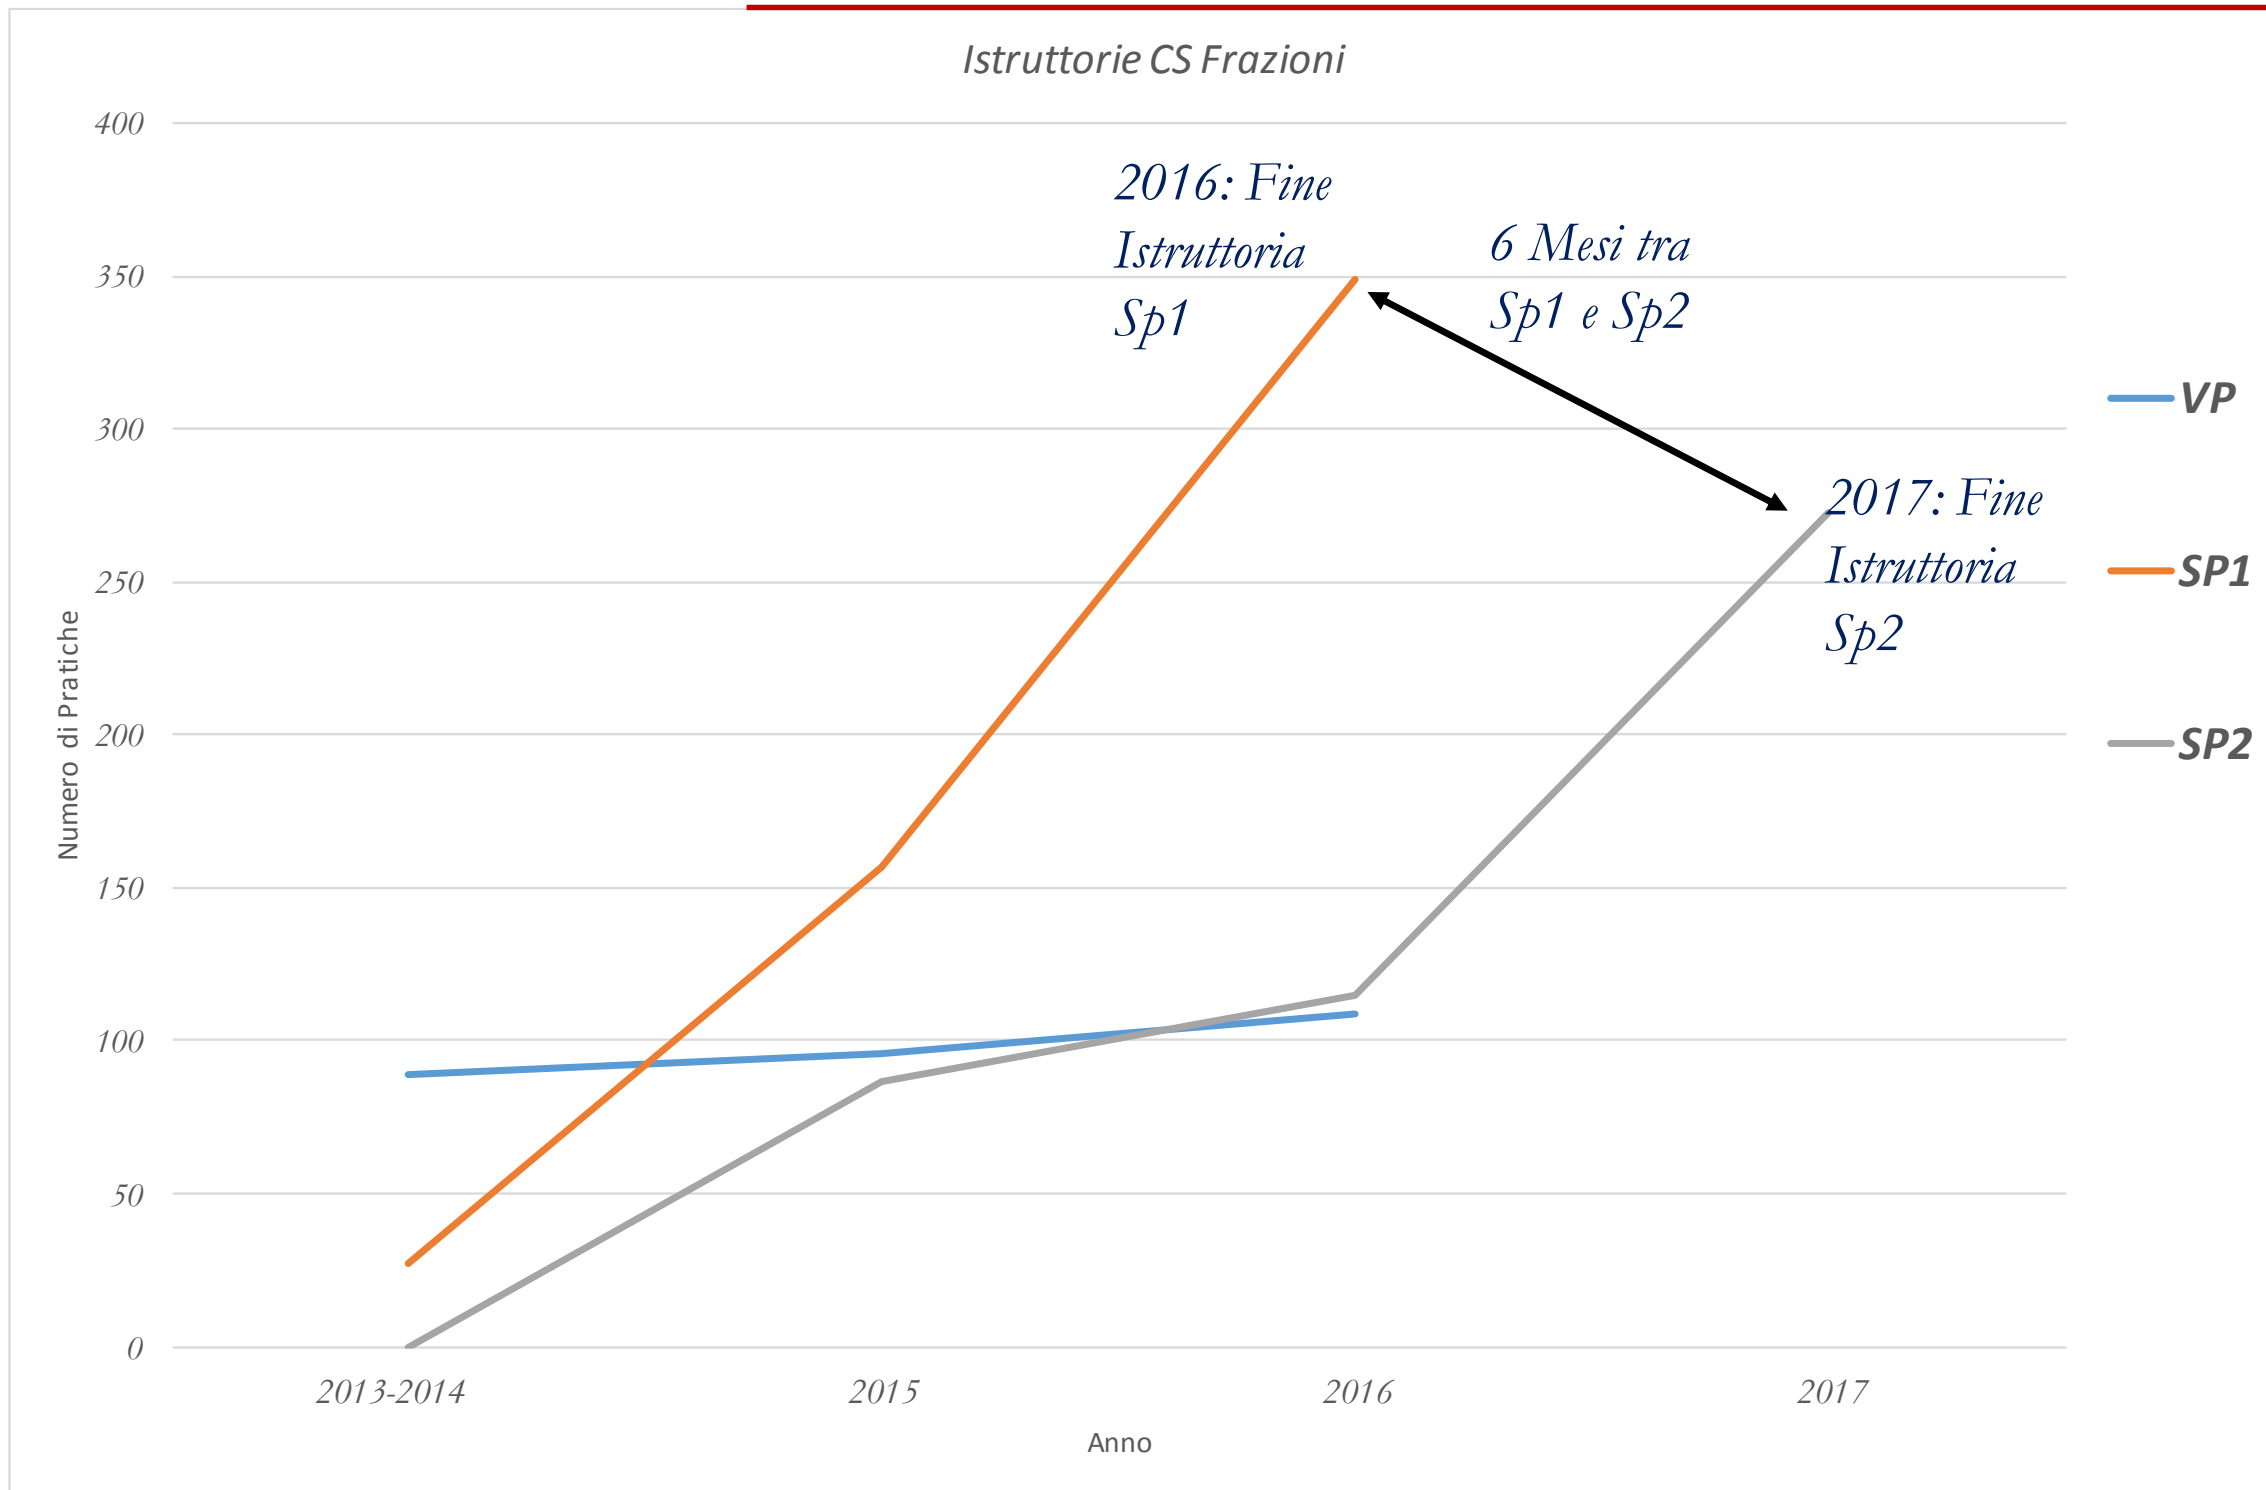



## Riepilogo Generale Frazioni D4-D5 e D3-D2

### RIEPILOGO GENERALE FRAZIONE DANNO D4-D5



Numero di pratiche B-C-E presentate 2905      Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni **1,435,179**

#### COMPARTI CENTRI STORICI FRAZIONI D4-D5

| Presentate | Istruite | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|------------|----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 995        | 456      | 85             | 454         | <b>67,569</b>          | <b>957,730</b>            |

#### PERIFERIA FRAZIONI D4-D5

| Presentate | Istruite | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|------------|----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 1910       | 1749     | 19             | 142         | <b>284,821</b>         | <b>67,635</b>             |

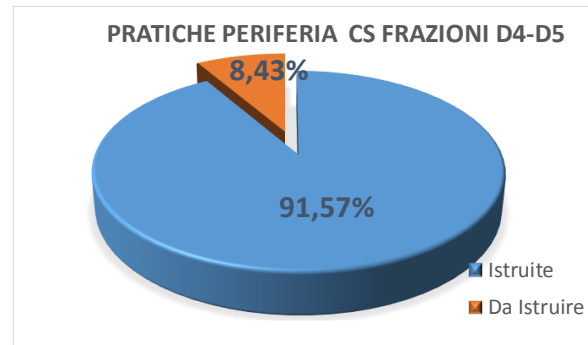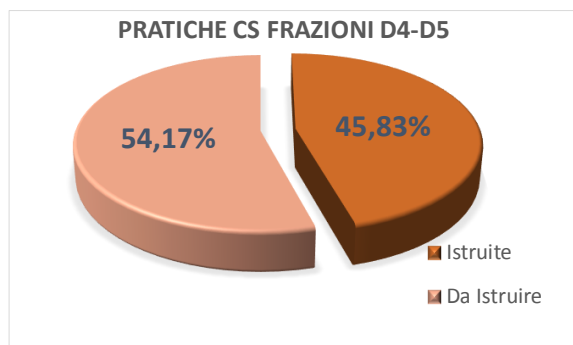

#### PROGRAMMAZIONE USRA

|     | Pratiche istruite | Pratiche da istruire 2016 | Importi Attesi 2016 | Pratiche da istruire 2017 | Importi Attesi 2017 |
|-----|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| VP  | 152               | 109                       | 43,482              | 0                         |                     |
| SP1 | 155               | 349                       | 678,722             | 0                         |                     |
| SP2 | 15                | 39+76                     | 259,698             | 234                       | 419,024             |

### RIEPILOGO GENERALE FRAZIONE DANNO D3-D2


Numero di pratiche totali presentate 5857      Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni **1,571,692**

#### CENTRI STORICI FRAZIONI D3-D2

| Presentate | Istruite | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|------------|----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 1053       | 485      | 21             | 547         | 52,289                 | 649,985                   |

#### PERIFERIA FRAZIONI D3-D2

| Presentate | Istruite | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|------------|----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 4837       | 4593     | 1              | 243         | 718,290                | 65,487                    |

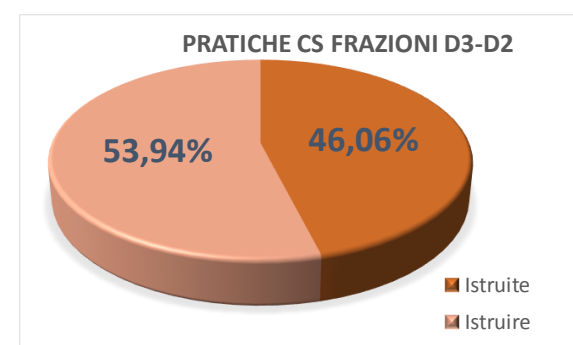

#### PROGRAMMAZIONE USRA

**AVVIO ISTRUTTORIA 2017**



## Riepilogo Frazioni D5-Onna

### RIEPILOGO FRAZIONE DI ONNA



|                                     |    |   |    |
|-------------------------------------|----|---|----|
| Numero di pratiche B-C-E presentate | 60 | Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni | 68 |
|-------------------------------------|----|---|----|

### RIEPILOGO FRAZIONE DI ONNA-CS COMPARTI

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 25         | 22        | 2              | 1           | 9.286                  | 0.338                     |
| SP1           | 35         | 22        | 3              | 10          | 0.754                  | 20.160                    |
| SP2           | 9          | 8         | 1              | 1           | 5.956                  | 7.845                     |
| <b>Totale</b> | <b>69</b>  | <b>52</b> | <b>6</b>       | <b>12</b>   | <b>15.242</b>          | <b>28.005</b>             |

### RIEPILOGO FRAZIONE DI ONNA-PERIFERIA

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 12         | 12        | 0              | 0           | 0,5390           | 0                   |
| SP1           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0,0000           | 0,0000              |
| SP2           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0,0000           | 0                   |
| <b>Totale</b> | <b>12</b>  | <b>12</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,5390</b>    | <b>€ 0,000</b>      |

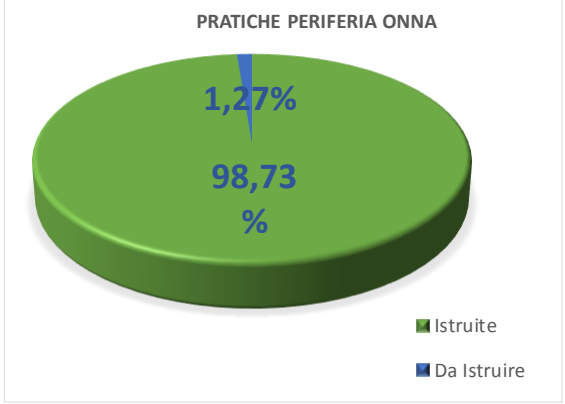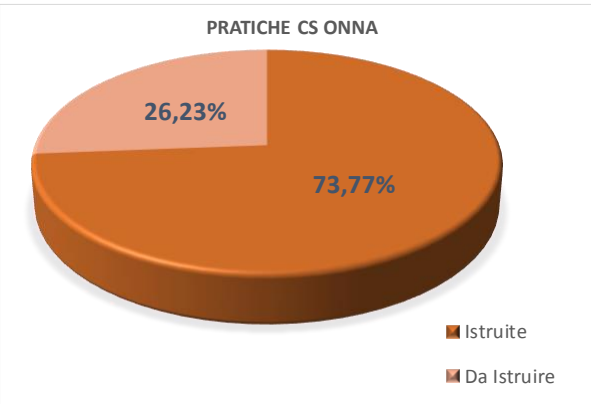



### PROGRAMMAZIONE ISTRUTTORIA CS -USRA

|     | Pratiche istruite 2015 | Pratiche da istruire 2016 | Importi Attesi 2016 | Pratiche da istruire 2017 | Importi Attesi 2017 |
|-----|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| VP  | 2                      |                           |                     |                           |                     |
| SP1 | 21                     | 24                        | 42,717              |                           |                     |
| SP2 | 7                      | 11                        | 22,656              | 14                        | 20,061              |


### FRAZIONE DI ONNA CANTIERI E MAPPE

Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire Sp2 e VP)

Cantieri Aperti: 7      Cantieri da aprire: 27

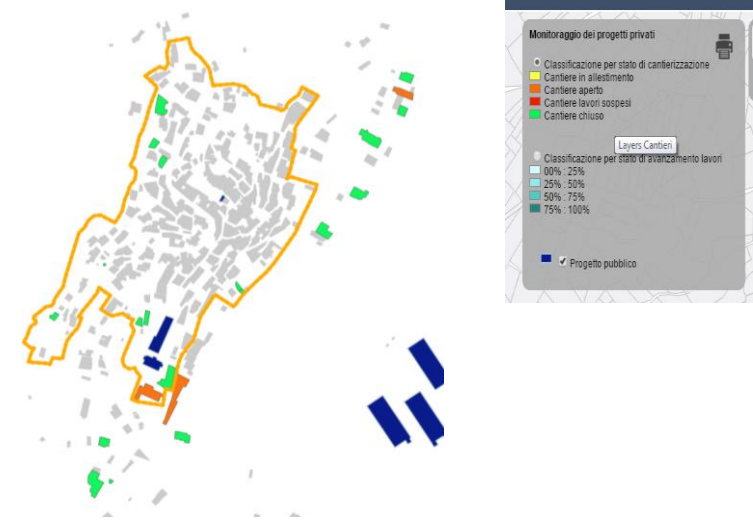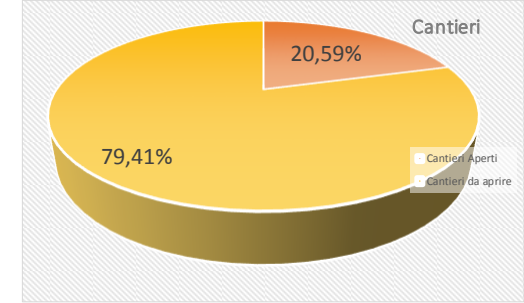

Mappe Cantieri

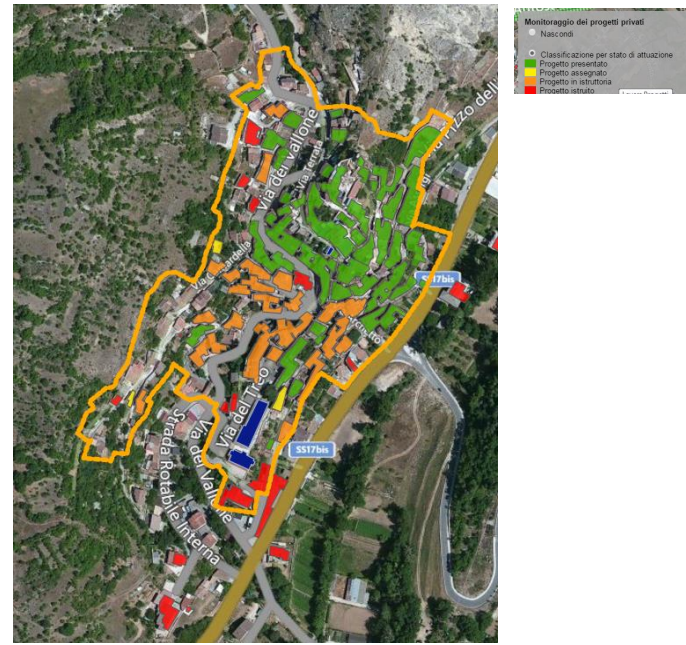



## Riepilogo Frazioni D5-Tempera

### FRAZIONE DI TEMPERA

Numero di pratiche totali presentate: 261  
 Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni: 104.714

### FRAZIONE DI TEMPERA- CS COMPARTI



| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 27         | 18        | 1              | 8           | 2.772                  | 660                       |
| SP1           | 19         | 6         | 2              | 11          | 0.157                  | 49.929                    |
| SP2           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0                      | 0                         |
| <b>Totale</b> | <b>46</b>  | <b>24</b> | <b>3</b>       | <b>19</b>   | <b>2.772</b>           | <b>50.589</b>             |

### FRAZIONE DI TEMPERA PERIFERIA

| Procedura     | Presentate | Istruite   | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|------------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 209        | 206        | 0              | 3           | 42.334           | € 1.083             |
| SP1           | 6          | 1          | 0              | 5           | 0.012            | € 1.629             |
| SP2           | 1          | 0          | 0              | 1           | 0                | € 619,000           |
| <b>Totale</b> | <b>216</b> | <b>207</b> | <b>0</b>       | <b>9</b>    | <b>42.334</b>    | <b>€ 3.331,000</b>  |

### FRAZIONE DI TEMPERA CANTIERI E MAPPE

Cantieri Aperti: 22  
 Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire Sp2 e VP): 41

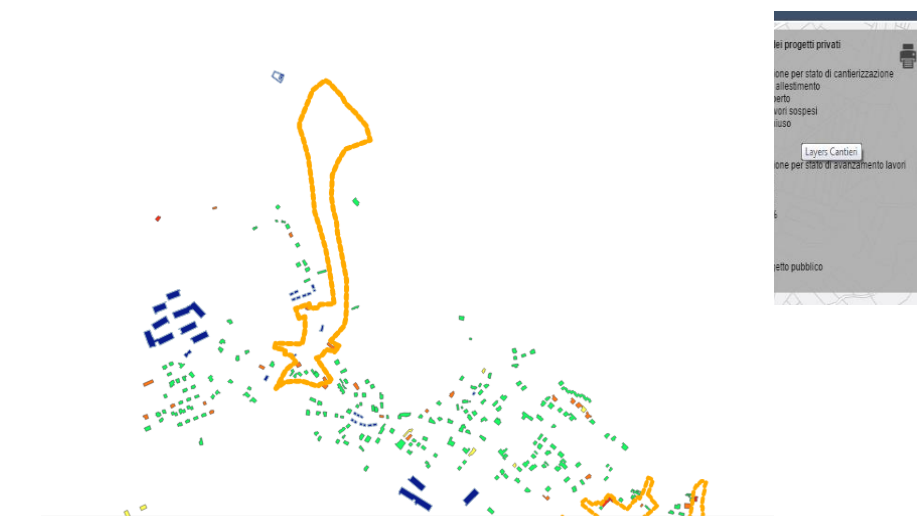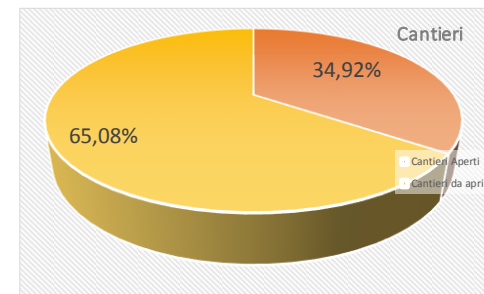

Mappa Cantieri





Monitoraggio dei progetti privati

- Nascondi
- Classificazione per stato di attuazione
- Progetto presentato
- Progetto assegnato
- Progetto in istruttoria
- Progetto istruito

Mappa Pratiche

### PROGRAMMAZIONE USRA

|     | Pratiche istruite |               | Importi Attesi 2016 | Pratiche da istruire |        | Importi Attesi 2017 |
|-----|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------|---------------------|
|     | 2015              | 2016          |                     | 2017                 | 2017   |                     |
| VP  | 14                | 11            | 1.743               | 0                    |        |                     |
| SP1 | 5                 | 20            | 41.356              | 0                    |        |                     |
| SP2 | 0                 | 1+9 in arrivo | 17.047              | 10                   | 24.309 |                     |

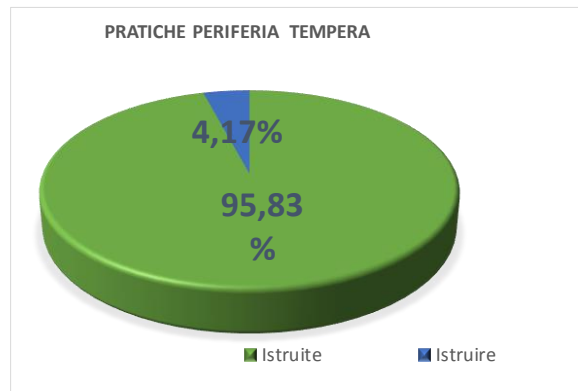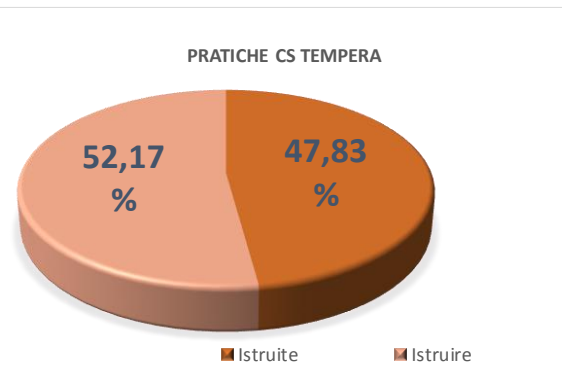



## Riepilogo Frazioni D5-Roio Poggio

### FRAZIONE DI ROIO POGGIO



Numero di pratiche totali presentate: 320  
 Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni: 151,777

### FRAZIONE DI ROIO POGGIO CS COMPARTI

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 94         | 68        | 11             | 15          | 16,849                 | 12,195                    |
| SP1           | 60         | 22        | 5              | 33          | 0,304                  | 77,970                    |
| SP2           | 4          | 1         | 2              | 1           | 0                      | 4,659                     |
| <b>Totali</b> | <b>158</b> | <b>91</b> | <b>18</b>      | <b>49</b>   | <b>17,153</b>          | <b>94,824</b>             |

### FRAZIONE DI ROIO POGGIO PERIFERIA

| Procedura     | Presentate | Istruite   | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|------------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 167        | 152        | 2              | 13          | 21,089           | 3,848               |
| SP1           | 5          | 0          | 0              | 5           | 0,000            | 1,504               |
| SP2           | 0          | 0          | 0              | 0           | 0,000            | 0,000               |
| <b>Totali</b> | <b>172</b> | <b>152</b> | <b>2</b>       | <b>18</b>   | <b>21,089</b>    | <b>€ 5,3520</b>     |

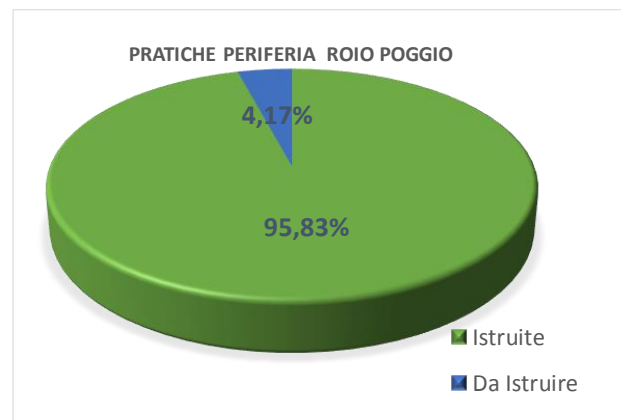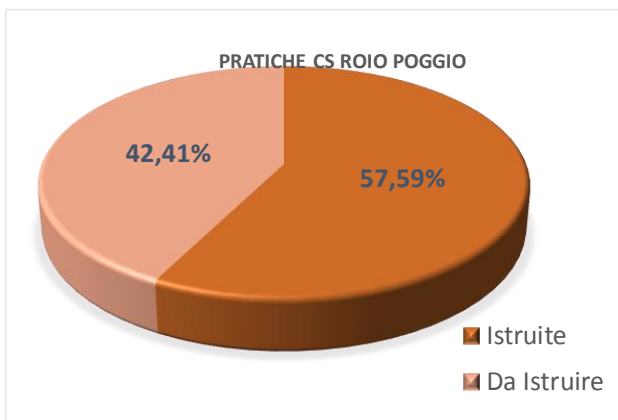



### PROGRAMMAZIONE CS USRA

|     | Pratiche istruite |      | Pratiche da istruire 2017 | Pratiche da istruire |                     |
|-----|-------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|
|     | 2015              | 2016 |                           | Importi Attesi 2016  | Importi Attesi 2017 |
| VP  | 23                | 26   | 0                         | 7,128                |                     |
| SP1 | 18                | 32   | 0                         | 69,595               |                     |
| SP2 | 0                 | 2+24 | 29                        | 22,570               | 47,025              |


### FRAZIONE DI ROIO POGGIO CANTIERI E MAPPE

Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire Sp2 e VP)

Cantieri Aperti: 20  
 Cantieri da aprire: 81

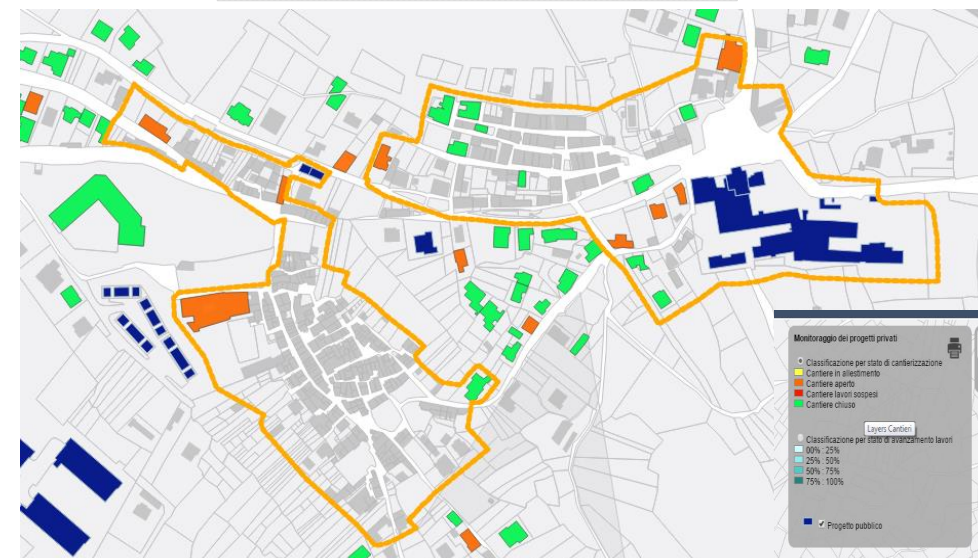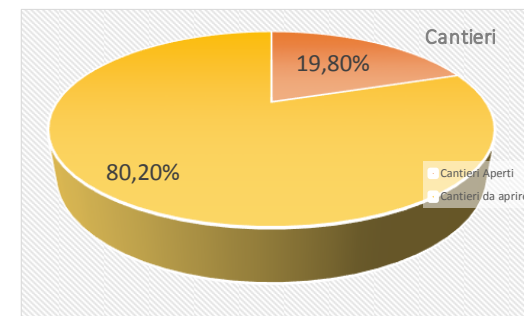

Mappa Cantieri

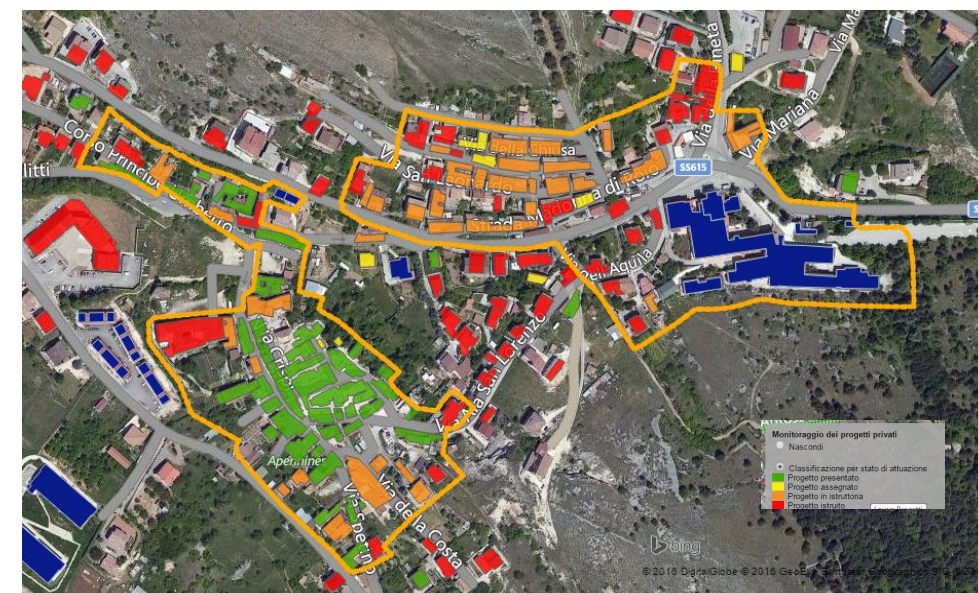

Mappa Pratiche



## Riepilogo Frazioni D5-San Gregorio

### FRAZIONE DI SAN GREGORIO

Numero di pratiche totali presentate: 117  
 Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni: 70.063


### FRAZIONE DI SAN GREGORIO CS COMPARTI

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 24         | 15        | 2              | 7           | 2.772                  | 1.835                     |
| SP1           | 33         | 14        | 2              | 17          | 0.5919                 | 25.751                    |
| SP2           | 2          | 0         | 1              | 1           | 0                      | 4.384                     |
| <b>Totali</b> | <b>59</b>  | <b>29</b> | <b>5</b>       | <b>25</b>   | <b>2.772</b>           | <b>31.970</b>             |


### FRAZIONE DI SAN GREGORIO PERIFERIA

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 33         | 27        | 0              | 6           | 7.037            | 0.270               |
| SP1           | 2          | 1         | 0              | 1           | 0.010            | 1.145               |
| SP2           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0                | 0                   |
| <b>Totali</b> | <b>35</b>  | <b>28</b> | <b>0</b>       | <b>7</b>    | <b>7.037</b>     | <b>1.145</b>        |

PRATICHE CS SAN GREGORIO

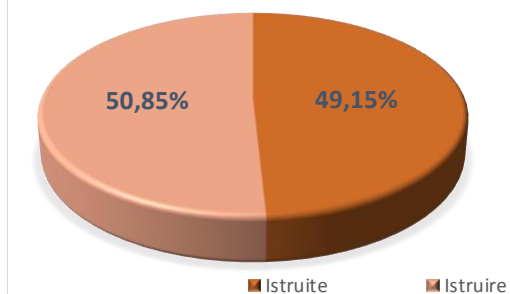

PRATICHE PERIFERIA SAN GREGORIO


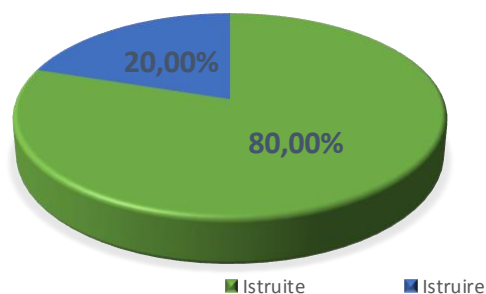


### PROGRAMMAZIONE USRA

|     | Pratiche istruite |                | Pratiche da istruire | Importi Attesi 2016 | Pratiche da istruire 2017 | Importi Attesi 2017 |
|-----|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|     | 2015              | 2016           |                      |                     |                           |                     |
| VP  | 5                 | 13             |                      | 1.835               | 0                         |                     |
| SP1 | 14                | 20             |                      | 25.731              | 0                         |                     |
| SP2 | 0                 | 1+12 in arrivo |                      | 18.302              | 11                        | 13.445              |

### FRAZIONE DI SAN GREGORIO CANTIERI E MAPPE

Cantieri Aperti: 6  
 Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire Sp2 e VP): 39

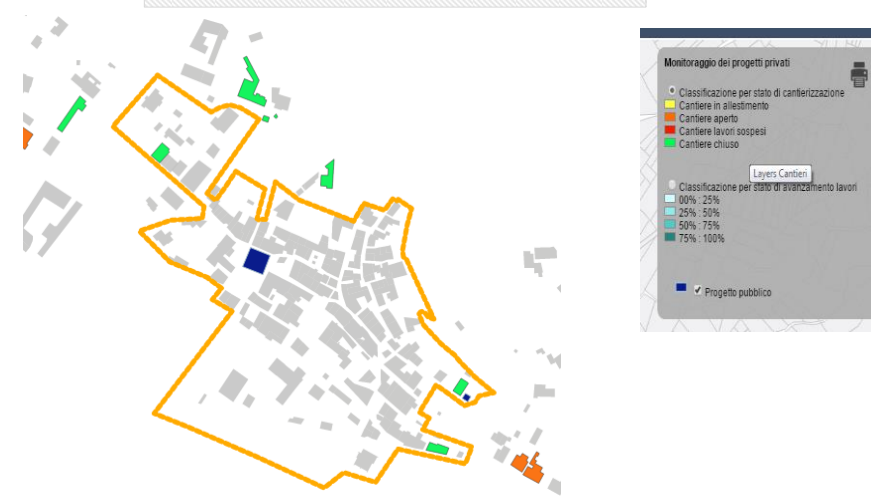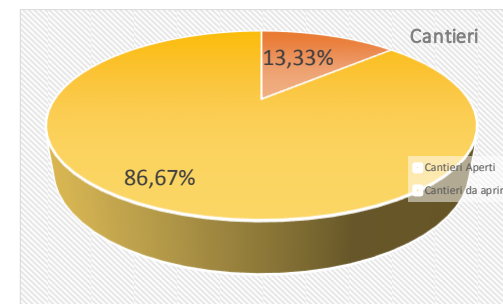

Mappa Cantieri







## Riepilogo Frazioni D5-Santa Rufina

### FRAZIONE DI SANTA RUFINA

Numero di pratiche totali presentate: 52  
 Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni: 31,280


### FRAZIONE DI SANTA RUFINA CS COMPARTI

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 36         | 28        | 1              | 7           | 4,787                  | 6,612                     |
| SP1           | 16         | 4         | 3              | 9           | 0,049                  | 14,520                    |
| SP2           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0                      | 0,000                     |
| <b>Totali</b> | <b>52</b>  | <b>32</b> | <b>4</b>       | <b>16</b>   | <b>4,836</b>           | <b>21,132</b>             |


### FRAZIONE DI SANTA RUFINA PERIFERIA

| Procedura     | Presentate | Istruite | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|----------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 4          | 4        | 0              | 0           | 0,426            | 0,000               |
| SP1           | 0          | 0        | 0              | 0           | 0,000            | 0,000               |
| SP2           | 0          | 0        | 0              | 0           | 0,000            | 0,000               |
| <b>Totali</b> | <b>4</b>   | <b>4</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,426</b>     | <b>€ 0,000</b>      |

#### PRATICHE CS SANTA RUFINA

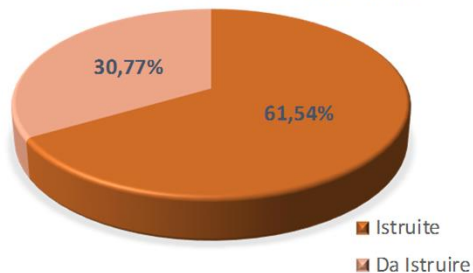

#### PRATICHE PERIFERIA SANTA RUFINA

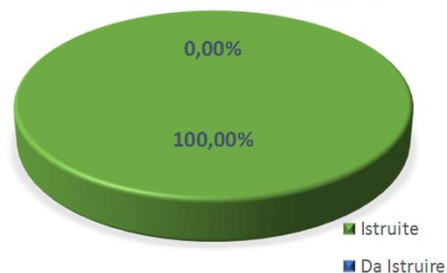


### PROGRAMMAZIONE CS USRA

|     | Pratiche istruite |      | Importi Attesi 2016 | Pratiche da istruire |        | Importi Attesi 2017 |
|-----|-------------------|------|---------------------|----------------------|--------|---------------------|
|     | 2015              | 2016 |                     | 2017                 | 2017   |                     |
| VP  | 4                 | 1    | 7,128               | 0                    |        |                     |
| SP1 | 2                 | 12   | 23,664              | 0                    |        |                     |
| SP2 | 0                 | 7    | 6,811               | 15                   | 16,853 |                     |

### FRAZIONE DI SANTA RUFINA CANTIERI E MAPPE

Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire Sp2 e VP)

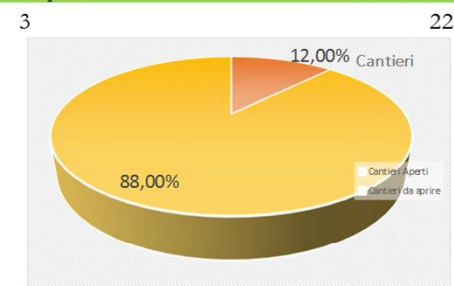

Mappa Cantieri





## Riepilogo Frazioni D4-Paganica

### FRAZIONE DI PAGANICA


Numero di pratiche totali presentate: 1051  
 Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni: 450.449

### FRAZIONE DI PAGANICA -Centro storico

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 60         | 41        | 11             | 8           | 7.381                  | 4.953                     |
| SP1           | 139        | 50        | 5              | 84          | 1.521                  | 183.146                   |
| SP2           | 22         | 2         | 3              | 17          | 2.049                  | 40.909                    |
| <b>Totali</b> | <b>221</b> | <b>93</b> | <b>19</b>      | <b>109</b>  | <b>10.951</b>          | <b>229.008</b>            |

### FRAZIONE DI PAGANICA-Periferia

| Procedura     | Presentate | Istruite   | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|------------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 839        | 795        | 9              | 35          | 129.612          | 17.917              |
| SP1           | 13         | 1          | 0              | 12          |                  | 10.475              |
| SP2           | 1          | 0          | 0              | 1           | 0                | 1.183               |
| <b>Totali</b> | <b>853</b> | <b>796</b> | <b>9</b>       | <b>48</b>   | <b>129.612</b>   | <b>29.575</b>       |


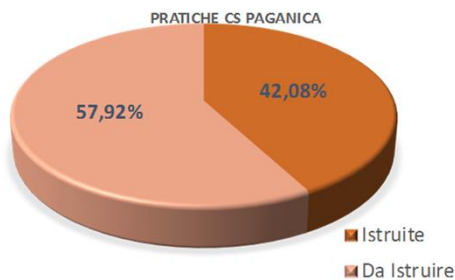


### PROGRAMMAZIONE CS USRA


|     | Pratiche istruite 2015 | Pratiche da istruire 2016 | Importi Attesi 2016 in Mil | Pratiche da istruire 2017 | Importi Attesi 2017 In Mil |
|-----|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| VP  | 44                     | 9                         | 2,839                      | 0                         | 0                          |
| SP1 | 42                     | 80                        | 165,626                    | 0                         | 0                          |
| SP2 | 3                      | 43                        | 80,658                     | 54                        | 84,968                     |

### FRAZIONE DI PAGANICA CANTIERI E MAPPE

Cantieri Aperti: 97  
 Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire): 193

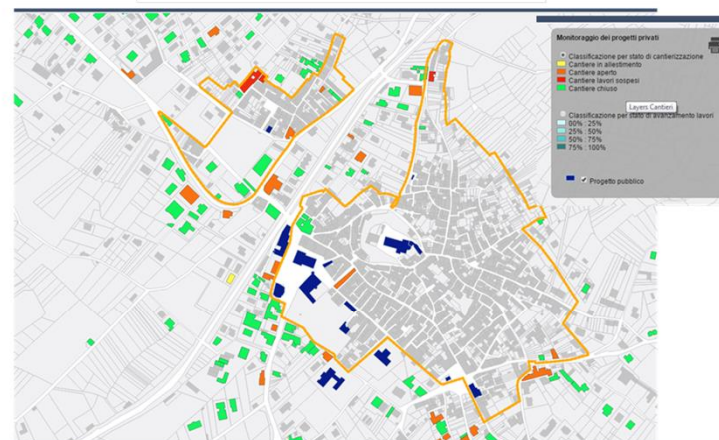

Mappa Cantieri

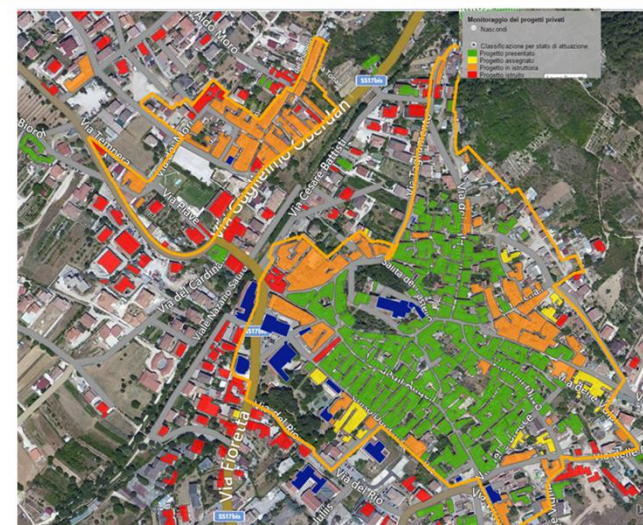



## Riepilogo Frazioni D4-Camarda

### FRAZIONE DI CAMARDA

|                                      |     |   |        |
|--------------------------------------|-----|---|--------|
| Numero di pratiche totali presentate | 182 | Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni | 88.750 |
|--------------------------------------|-----|---|--------|


### FRAZIONE DI CAMARDA CS COMPARTI

| Procedura     | Presentate | Istruite   | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|------------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 122        | 119        | 0              | 3           | 10.110                 | 1.782                     |
| SP1           | 60         | 16         | 4              | 40          | 0.230                  | 54.755                    |
| SP2           | 1          | 0          | 0              | 1           | 0                      | 1.027                     |
| <b>Totali</b> | <b>183</b> | <b>135</b> | <b>4</b>       | <b>44</b>   | <b>10.110</b>          | <b>57.564</b>             |


### FRAZIONE DI CAMARDA -Periferia

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 78         | 78        | 0              | 0           | 7.072            | 0                   |
| SP1           | 1          | 0         | 0              | 1           | 0                | € 0,545             |
| SP2           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0                | 0                   |
| <b>Totali</b> | <b>79</b>  | <b>78</b> | <b>0</b>       | <b>1</b>    | <b>7.072</b>     | <b>€ 0,545</b>      |

PRATICHE CS CAMARDA



PRATICHE CS CAMARDA





### PROGRAMMAZIONE CS USRA


|     | Pratiche istruite |                           | Importi Attesi 2016 | Pratiche da istruire |      | Importi Attesi 2017 |
|-----|-------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|
|     | 2015              | 2016                      |                     | 2017                 | 2017 |                     |
| VP  | 4                 | 3                         | 1.782               | 0                    | 0    |                     |
| SP1 | 15                | 35                        | 58.133              | 0                    | 0    |                     |
| SP2 | 5                 | 1 già presentate-8 attese | 11.212              | € 66,00              | 44   |                     |

### FRAZIONE DI CAMARDA CANTIERI E MAPPE

|                 |    |  |     |
|-----------------|----|--|-----|
| Cantieri Aperti | 10 | Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire Sp2 e VP) | 101 |
|-----------------|----|--|-----|

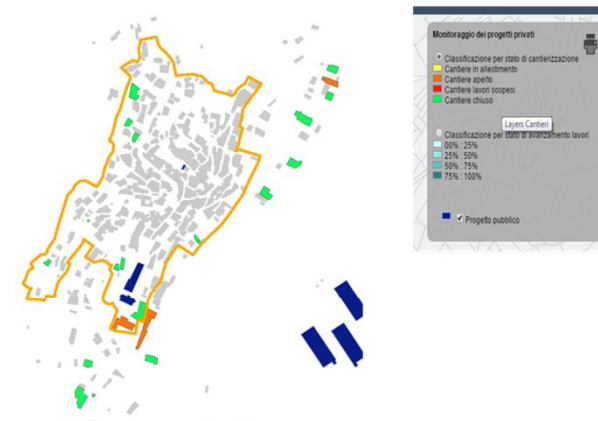

Mappa Cantieri

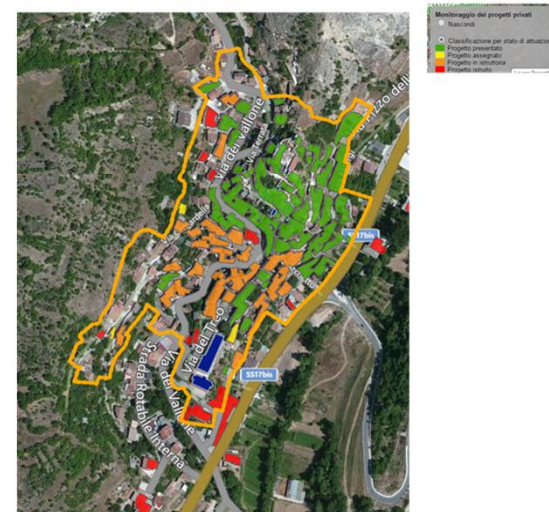



## Riepilogo Frazioni D4-Bagno Grande-Ripa

### FRAZIONE DI BAGNO GRANDE E RIPÀ

 Numero di pratiche totali presentate  
86

 Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni  
58.634


### FRAZIONE DI BAGNO GRANDE E RIPÀ CENTRO STORICO

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 24         | 22        | 2              | 0           | 2,999                  | 0,187                     |
| SP1           | 29         | 7         | 5              | 17          | 0,143                  | 40,361                    |
| SP2           | 2          | 0         | 1              | 1           | 0,000                  | 1,597                     |
| <b>Totale</b> | <b>55</b>  | <b>29</b> | <b>8</b>       | <b>18</b>   | <b>3,142</b>           | <b>42,145</b>             |


### FRAZIONE DI BAGNO GRANDE E RIPÀ PERIFERIA

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 32         | 30        | 0              | 2           | 5,100            | 0,350               |
| SP1           | 1          | 0         | 0              | 1           | 0                | 0,630               |
| SP2           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0                | 0,000               |
| <b>Totale</b> | <b>33</b>  | <b>30</b> | <b>0</b>       | <b>3</b>    | <b>5</b>         | <b>€ 0,9800</b>     |

PRATICHE CS BAGNO GRANDE E RIPÀ



PRATICHE PERIFERIA BAGNO GRANDE E RIPÀ





### PROGRAMMAZIONE USRA

|     | Pratiche istruite |               | Importi Attesi 2016 | Pratiche da istruire 2017 |  | Importi Attesi 2017 |
|-----|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------|--|---------------------|
|     | 2015              | 2016          |                     |                           |  |                     |
| VP  | 14                | 11            | 1.743               | 0                         |  |                     |
| SP1 | 5                 | 20            | 41.356              | 0                         |  |                     |
| SP2 | 0                 | 1+9 in arrivo | 17.047              | 10                        |  | 24.309              |

### FRAZIONE DI BAGNO GRANDE E RIPÀ CANTIERI E MAPPE

 Cantieri Aperti  
5

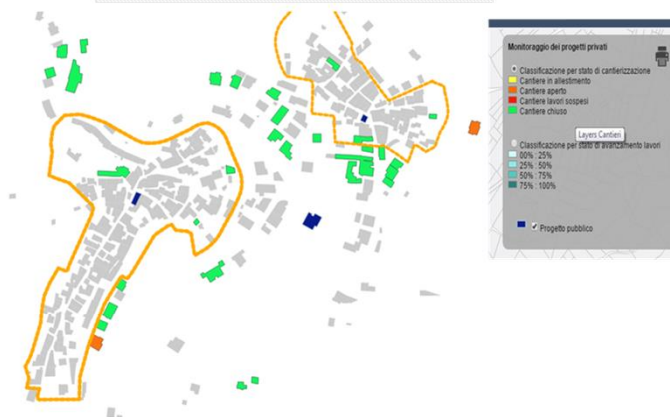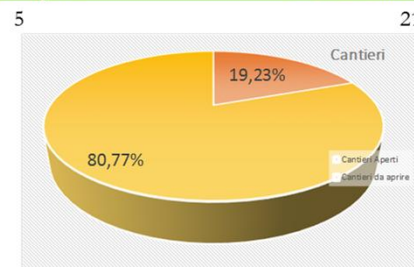 Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire Sp2 e VP)  
21


Mappa Cantieri





## Riepilogo Frazioni D4-Arischia

### FRAZIONE DI ARISCHIA

Numero di pratiche totali presentate: 265  
 Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni: 155,415


### FRAZIONE DI ARISCHIA CS COMPARTI

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 61         | 55        | 2              | 4           | 3,861                  | 5,100                     |
| SP1           | 87         | 17        | 7              | 63          | 0,273                  | 97,825                    |
| SP2           | 1          | 0         | 0              | 1           | 0                      | 0,000                     |
| <b>Totali</b> | <b>149</b> | <b>72</b> | <b>9</b>       | <b>68</b>   | <b>4,134</b>           | <b>102,925</b>            |


### FRAZIONE DI ARISCHIA PERIFERIA

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 112        | 94        | 0              | 18          | 11,311           | 7,129               |
| SP1           | 5          | 0         | 0              | 5           | 0,000            | 3,563               |
| SP2           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0,000            | 0,000               |
| <b>Totali</b> | <b>117</b> | <b>94</b> | <b>0</b>       | <b>23</b>   | <b>11,311</b>    | <b>€ 10,6920</b>    |

PRATICHE CS ARISCHIA



PRATICHE PERIFERIA ARISCHIA





### PROGRAMMAZIONE USRA

|     | Pratiche istruite |      | Importi Attesi 2016 | Pratiche da istruire 2017 |  | Importi Attesi 2017 |
|-----|-------------------|------|---------------------|---------------------------|--|---------------------|
|     | 2015              | 2016 |                     |                           |  |                     |
| VP  | 8                 | 3    | 2,211               | 0                         |  |                     |
| SP1 |                   | 59   | 86,121              | 0                         |  |                     |
| SP2 |                   | 12   | 15,036              | 51                        |  | 71,085              |


### FRAZIONE DI ARISCHIA CANTIERI E MAPPE

Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire Sp2 e VP)

Cantieri Aperti: 23  
 Cantieri da aprire: 76

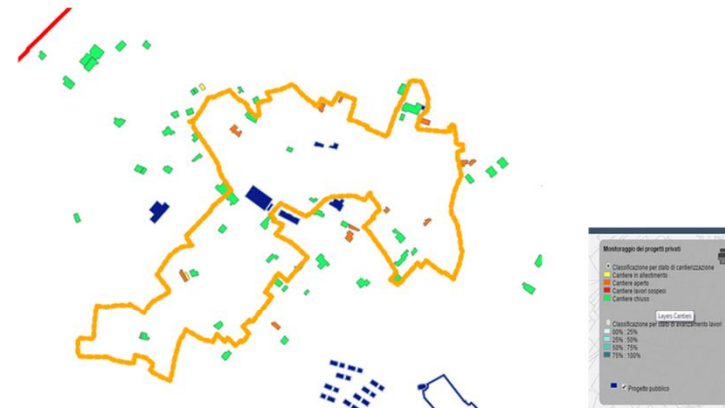

Mappa Cantieri

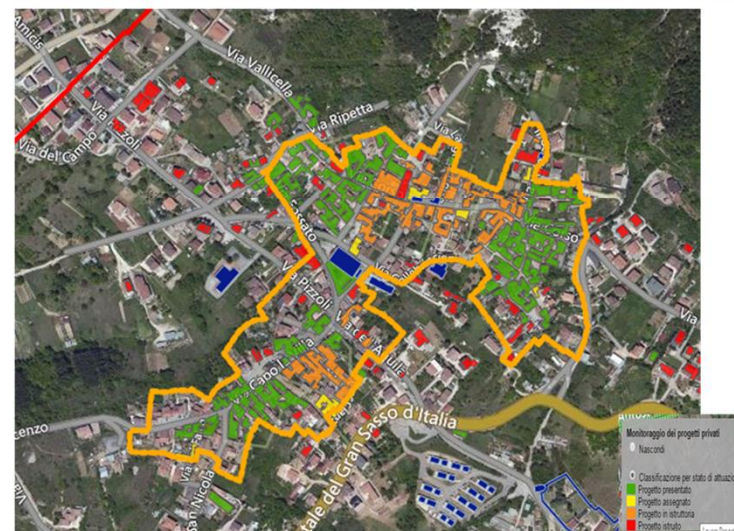



## Riepilogo Frazioni D4-Roio Piano

### FRAZIONE DI ROIO PIANO

Numero di pratiche totali presentate: 150  
 Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni: 79,121


### FRAZIONE DI ROIO PIANO CS COMPARTI

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 82         | 64        | 4              | 14          | 14,034                 | 5,254                     |
| SP1           | 25         | 5         | 5              | 15          | 0,119                  | 48,847                    |
| SP2           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0                      | 55,115                    |
| <b>Totale</b> | <b>107</b> | <b>69</b> | <b>9</b>       | <b>29</b>   | <b>14,153</b>          | <b>60,369</b>             |


### FRAZIONE DI ROIO PIANO PERIFERIA

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 83         | 77        | 3              | 3           | 7,379            | 8,718               |
| SP1           | 5          | 0         | 0              | 5           | 0,000            | 0,000               |
| SP2           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0,000            | 0,000               |
| <b>Totale</b> | <b>88</b>  | <b>77</b> | <b>3</b>       | <b>8</b>    | <b>7,379</b>     | <b>€ 8,718</b>      |

PRATICHE CS ROIO PIANO



PRATICHE PERIFERIA ROIO PIANO




### PROGRAMMAZIONE USRA

|     | Pratiche istruite |      | Importi Attesi 2016 | Pratiche da istruire |        | Importi Attesi 2017 |
|-----|-------------------|------|---------------------|----------------------|--------|---------------------|
|     | 2015              | 2016 |                     | 2017                 | 2017   |                     |
| VP  | 9                 | 2    |                     | 0                    |        |                     |
| SP1 | 4                 | 19   | 46,153              | 0                    |        |                     |
| SP2 |                   | 9    | 17,262              | 21                   | 28,891 |                     |

### FRAZIONE DI ROIO PIANO CANTIERI E MAPPE

Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire Sp2 e VP)

Cantieri Aperti: 9  
 Cantieri da aprire: 32

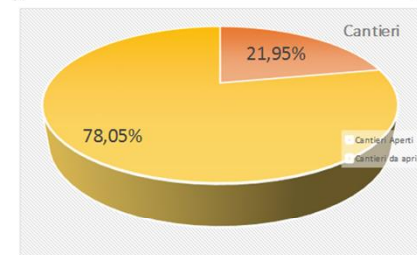

Mappa Cantieri


Monitoraggio dei progetti privati

- Classificazione per stato di carteggiamento
- Cantieri in pianificazione
- Cantieri aperti
- Cantieri lavori sospesi
- Cantieri chiusi

Classificazione per stato di avanzamento lavori

- 80% - 25%
- 25% - 50%
- 50% - 75%
- 75% - 100%

Progetto pubblico

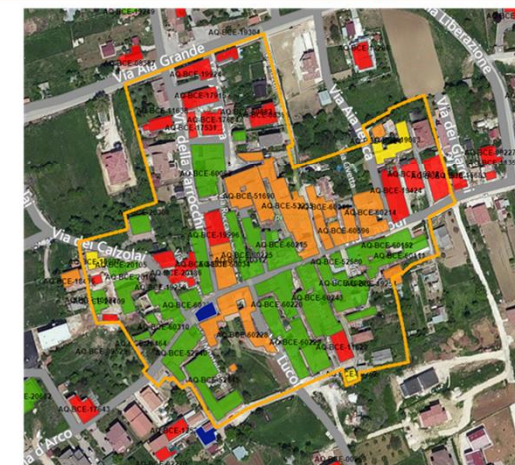

Mappa Pratiche

Monitoraggio dei progetti privati

Nascosti

- Classificazione per stato di attuazione
- Progetto presentato
- Progetto assegnato
- Progetto in istruttoria
- Progetto stralciato

## Riepilogo Frazioni D4-Bazzano

### FRAZIONE DI BAZZANO

Numero di pratiche totali presentate: 249  
 Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni: 76,528


### FRAZIONE DI BAZZANO CS COMPARTI

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 38         | 36        | 1              | 1           | 2,743                  | 0,956                     |
| SP1           | 33         | 9         | 4              | 20          | 0,145                  | 39,798                    |
| SP2           | 4          | 0         | 0              | 4           | 0                      | 0,000                     |
| <b>Totale</b> | <b>75</b>  | <b>45</b> | <b>5</b>       | <b>25</b>   | <b>2,888</b>           | <b>40,754</b>             |


### FRAZIONE DI BAZZANO PERIFERIA

| Procedura     | Presentate | Istruite   | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|------------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 174        | 168        | 1              | 5           | 14,690           | 0,926               |
| SP1           | 4          | 1          | 0              | 3           | 0,011            | 4,607               |
| SP2           | 0          | 0          | 0              | 0           | 0,000            | 0,000               |
| <b>Totale</b> | <b>178</b> | <b>169</b> | <b>1</b>       | <b>8</b>    | <b>14,701</b>    | <b>€ 5,5330</b>     |

PRATICHE CS BAZZANO



PRATICHE PERIFERIA BAZZANO





### PROGRAMMAZIONE CS USRA

|     | Pratiche istruite |      | Importi Attesi 2016 | Pratiche da istruire |        | Importi Attesi 2017 |
|-----|-------------------|------|---------------------|----------------------|--------|---------------------|
|     | 2015              | 2016 |                     | 2017                 | 2017   |                     |
| VP  | 8                 | 1    | 0,956               | 0                    |        |                     |
| SP1 | 9                 | 23   | 39,798              | 0                    |        |                     |
| SP2 |                   | 12   | 19,640              | 13                   | 20,158 |                     |


### FRAZIONE DI BAZZANO CANTIERI E MAPPE

Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire Sp2 e VP)

Cantieri Aperti: 8  
 Cantieri da aprire: 28

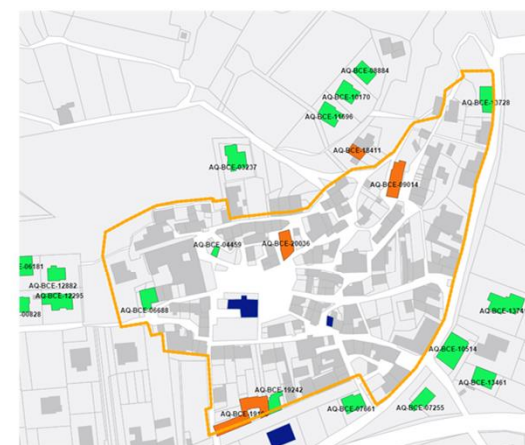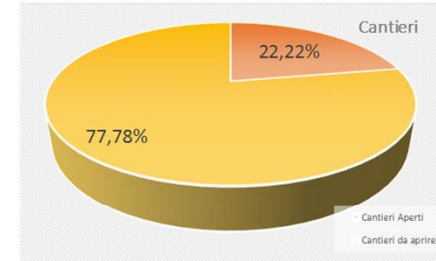

Mappa Cantieri





## Riepilogo Frazioni D4-Civita di bagno

### FRAZIONE DI CIVITA DI BAGNO

Numero di pratiche totali presentate: 255  
 Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni: 71,413


### FRAZIONE DI CIVITA DI BAGNO CS COMPARTI

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 22         | 16        | 1              | 5           | 7,331                  | 3,060                     |
| SP1           | 6          | 2         | 2              | 2           | 0,038                  | 8,440                     |
| SP2           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0                      | 0,000                     |
| <b>Totale</b> | <b>28</b>  | <b>18</b> | <b>3</b>       | <b>7</b>    | <b>7,369</b>           | <b>11,500</b>             |


### FRAZIONE DI CIVITA DI BAGNO PERIFERIA

| Procedura     | Presentate | Istruite   | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|------------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 377        | 358        | 4              | 15          | 37,697           | 4,679               |
| SP1           | 2          | 0          | 0              | 2           | 0,000            | 0,292               |
| SP2           | 0          | 0          | 0              | 0           | 0,000            | 0,000               |
| <b>Totale</b> | <b>379</b> | <b>358</b> | <b>4</b>       | <b>17</b>   | <b>37,697</b>    | <b>€ 4,9710</b>     |

PRATICHE CS CIVITA DI BAGNO



PRATICHE PERIFERIA CIVITA DI BAGNO




### PROGRAMMAZIONE USRA


|     | Pratiche istruite 2015 | Pratiche da istruire 2016 | Importi Attesi 2016 | Pratiche da istruire 2017 | Importi Attesi 2017 |
|-----|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| VP  | 28                     | 12                        | 3,060               | 0                         |                     |
| SP1 | 2                      | 12                        | 7,417               | 0                         |                     |
| SP2 |                        | 5                         | 2,600               | 4                         | 4,817               |

### FRAZIONE DI CIVITA DI BAGNO CANTIERI E MAPPE

Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire Sp2 e VP): 27  
 Cantieri Aperti: 32

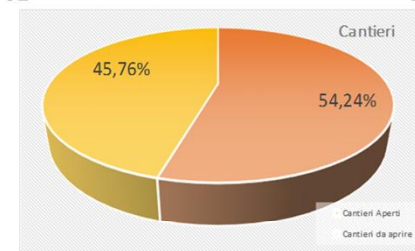

Mappa Cantieri

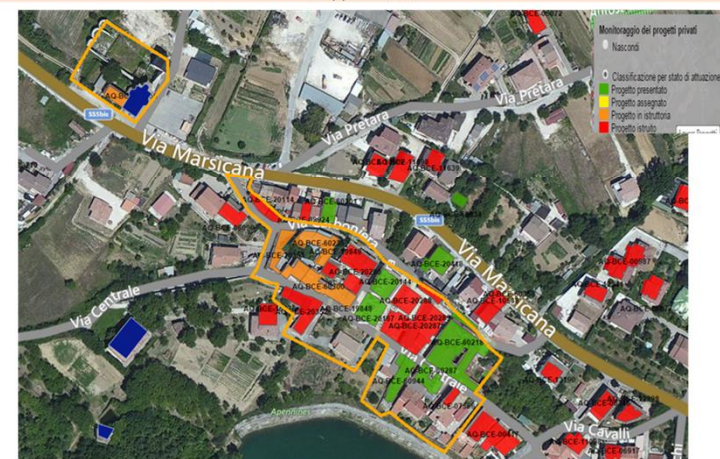

Mappa Pratiche



## Riepilogo Frazioni D4-Colle di Roio

### FRAZIONE DI COLLE DI ROIO

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Numero di pratiche totali presentate | Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni |
| 95                                   | 29,493  |

### FRAZIONE DI COLLE DI ROIO CS COMPARTI

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso (Mil) | Importo da istruire (Mil) |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| VP            | 28         | 21        | 1              | 6           | 3,028                  | 4,004                     |
| SP1           | 19         | 6         | 2              | 11          | 0,038                  | 14,431                    |
| SP2           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0                      | 0,000                     |
| <b>Totali</b> | <b>47</b>  | <b>27</b> | <b>3</b>       | <b>17</b>   | <b>3,066</b>           | <b>18,435</b>             |



### FRAZIONE DI COLLE DI ROIO PERIFERIA

| Procedura     | Presentate | Istruite  | In istruttoria | Da istruire | Importo concesso | Importo da istruire |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| VP            | 46         | 41        | 1              | 4           | 4,698            | 0,994               |
| SP1           | 2          | 0         | 0              | 2           | 0,000            | 0,292               |
| SP2           | 0          | 0         | 0              | 0           | 0,000            | 0,000               |
| <b>Totali</b> | <b>48</b>  | <b>41</b> | <b>1</b>       | <b>6</b>    | <b>4,698</b>     | <b>€ 1,2860</b>     |


### FRAZIONE DI COLLE DI ROIO CANTIERI E MAPPE

Cantieri Aperti      Cantieri da aprire (presunto sulla base di pratiche ancora da istruire Sp2 e VP)


10      25

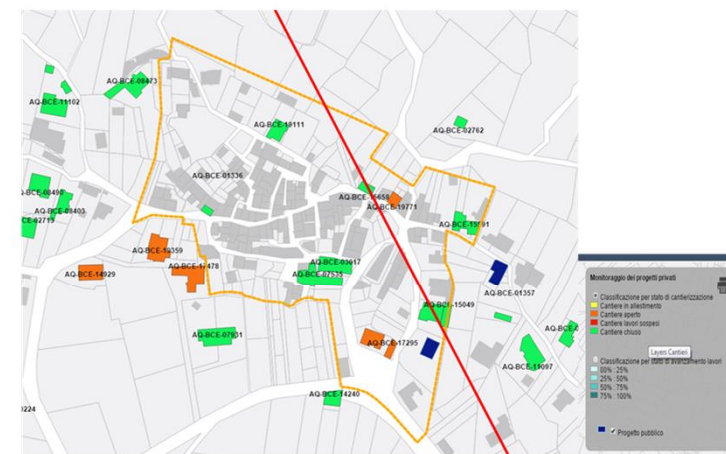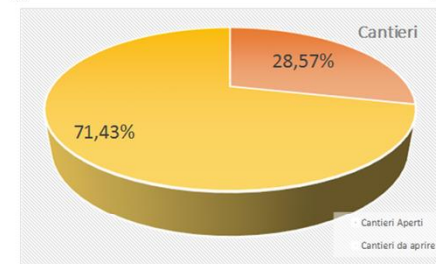


Mappa Cantieri

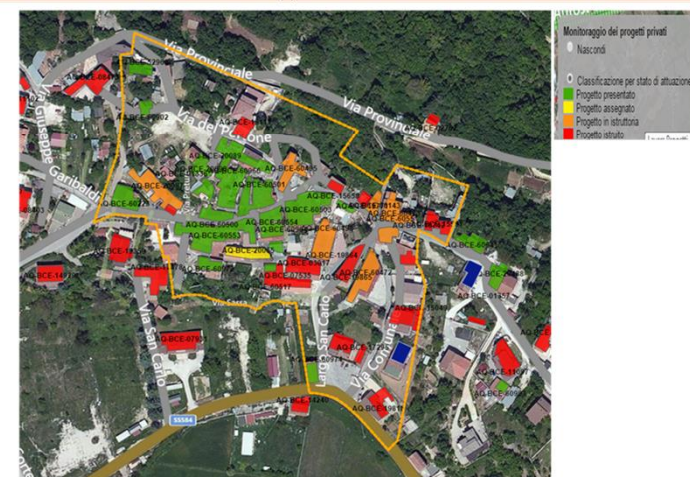

PRATICHE CS COLLE DI ROIO



PRATICHE PERIFERIA COLLE DI ROIO



### PROGRAMMAZIONE USRA

|     | Pratiche istruite |      | Importi Attesi 2016 | Pratiche da istruire |       | Importi Attesi 2017 |
|-----|-------------------|------|---------------------|----------------------|-------|---------------------|
|     | 2015              | 2016 |                     | 2017                 | 2017  |                     |
| VP  | 7                 | 19   | 5,737               | 0                    |       |                     |
| SP1 | 4                 | 15   | 12,159              | 0                    |       |                     |
| SP2 |                   | 6    | 2,453               | 6                    | 9,706 |                     |
